

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS		Supervisor: Iturbe Jose - Britos dante - Lopez Mateo		Fecha Inicio: 15/08/2023		
Bloque:		Equipo: H&P/211		AFE No.: 1NXP-02006-PE		
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,		Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m		Costo AFE: 1,00 USD		
Progreso: 0,00 m		DFS: 21,64	Costo Acumulado: 5,780,849 USD	Costo Diario: 1,205,257 USD		
Horas de Rotación 0,00 hs		Dias Plan: 32,00	Costo Plan: 6,716,583 USD	TMD: 4.674,00 m		
Promedio ROP: 0,00 m/h		% Dias Incurrido: 67,63	Gastos: 86,07 %	TVD: 3.004,68 m		
Oper. Act: Cia Nabors realiza reunión para desmontar elementos de entubación.						
Resúmen: Entubo casing 5" 21.4# P110 W625 controlando desplazamiento hasta 4659.4 m. Realizo build up + flow check,ok. Retiro bearing. Enrosco colgador y bajante del mismo. Profundizo y colgo casing. Empaqueta pozo.						
Próx. 24 hs: Desmontar equipamiento de entubación. Purgar líneas. Acondicionar y realizar skidding de CLN.x-2006 a CLN.x-2005. Montar equipamiento y cementar off-line etapa producción CLN x.2006.						
Programa: Realizar skidding de CLN.x-2006 a CLN.x-2005. Cementar off-line.						
Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	01:15	19,25	P-ENTUB	ENTUBA	Continua entubando casing 5" P110 21.4# W625, controlando desplazamiento desde 1437 m hasta 4623 m, alineado por bba auxiliar. * A partir de 3100 m entuba con rotación 20 rpm por observar asentamiento.	
01:15	01:30	0,25	P-ENTUB	BUILDUP	Realiza build up, no levanta presión.	
01:30	01:45	0,25	P-ENTUB	FCHECK	Realiza flow check, observando pozo estático. * En simultáneo realiza reunión para retirar bearing y colgar casing.	
01:45	02:30	0,75	P-ENTUB	DBEARING	Cia WFT MPD retira bearing.	
02:30	03:15	0,75	P-ENTUB	DBEARING	Compañía MMA enrosca colgador 5" y bajante del mismo. Profundiza y cuelga casing. * Zapato 4659.44 m, collar 4647.37 m.	
03:15	03:30	0,25	DTM-PR	CABEZA*	Retira casing de maniobra con bajante colgador.	
03:30	04:30	1,00	DTM-PR	CABEZA*	Arma herramienta de lavado. Profundiza y lava alojamiento de empaquetador. Arma pack off 11"-5" con bajante del mismo. Profundiza e instala. Realiza prueba entre sellos con P 9500 psi, ok.	
04:30	05:00	0,50	DTM-PR	CABEZA*	Activa snap rings. Realiza prueba de tensión con 10 klb. Desvincula bajante y retira casing a playa. Instala BPV.	
05:00	05:45	0,75	DTM-PR	DMPD*	Cia. Weatherford coloca tapón en RCD. Retira bearing a playa.	
05:45	06:00	0,25	DTM-PR	DCRT*	Cia Nabors realiza reunión para desmontar elementos de entubación.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo

Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)
GUIA	12,25	9,63	750,34
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.902,70
PRODUCCION	6,13		

Plan de Pozo

Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	12,25	9,63	1.170,00
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.620,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00

Survey

TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
4.674,00	3.004,68	88,01	354,08	1.743,06	214,47	1.394,19	0,000

LODO - EMULSION INVERSA

TMD Cheq.(m): 4.674,00	FilterCake(32nd"): 6,40	GELS (0s/10s/10m/30
Densidad(g/cc): 1,800	HTHP(cc/30min): 6,40	
YP (lb/100 ft2): 11,00	Solids (%): 87,00	/ 6 / 12
FV (s/qt): 60,00	Oil (%): 8,00	/ 18
PV (cp): 27,00	pH: 8,00	
Temp C:	MBT (lbm/bbl): 64,00	

FIT/LOT


Tipo de Prueba:	FIT
TMD:	1.912,00
TVD:	1.884,50
Densidad:	1,46(g/cc)
Pres. en Sup:	2.010,00
EMW:	2,21(g/cc)

Volúmenes de Lodo


Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	5,00	Acum. Sup.(m3)	305,60
Vol.Anular Tot.(m3)	72,80	Total en Pozo(m3)	1,00	Acum. Pozo(m3)	162,00
Tot. Piletas(m3)	252,50				
Vol. Tot. Sis(m3)	325,30	Total(m3)	6,00	Tot. Cum.(m3)	467,60

Pérdida de Lodo

Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	5,00	Acum. Sup.(m3)	305,60
Vol.Anular Tot.(m3)	72,80	Total en Pozo(m3)	1,00	Acum. Pozo(m3)	162,00
Tot. Piletas(m3)	252,50				
Vol. Tot. Sis(m3)	325,30	Total(m3)	6,00	Tot. Cum.(m3)	467,60

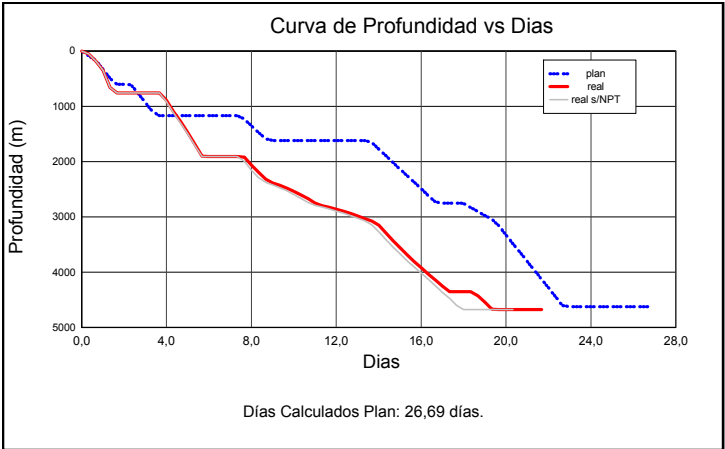

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,906	81,946	82,296	99,57
CABZ COLGADORA	4,442	167,353	162,250	103,15
TRATAMIENTOS EFLUENTES	936	27,109	110,300	24,58
CASING	,016,777	1,564,982	1,620,394	96,58
DIRECCIONAL	0	436,735	630,690	69,25
OTROS	15,200	351,037	271,824	129,14
CTRL SOLIDOS	11,562	238,815	208,812	114,37
EQUIPO	43,247	1,057,629	1,239,439	85,33
MPD	21,113	339,110	335,308	101,13
CTRL GEOLOGICO	3,300	85,134	63,848	133,34
CEMENTACION	0	95,056	349,197	27,22
LODO	18,145	514,185	837,455	61,40
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	12,005	348,165	160,341	217,14
ENTUBAMIENTO	51,425	78,560	73,400	107,03
TREPANOS	0	96,367	113,800	84,68
PERFILAJE	0	57,000	25,000	228,00
DTM	0	177,665	349,599	50,82
EFLUENTES	3,200	64,000	82,632	77,45
TOTAL	1,205,257	5,780,849	6,716,583	86,07

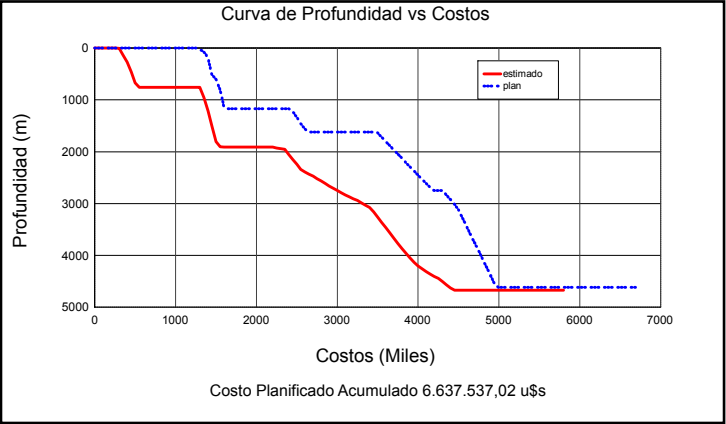

Inspección / Perforación			
Última Prueba BOP:	03/10/2023	Prox. Prueba BOP:	24/10/2023
Seguridad			
Tarjetas de Parada:	0		
