

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD

Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: <span style="color: green;">●</span> 221,971 USD	Costo Diario: 18,346 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD	TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 2,73 %	TVD: m

Oper. Act:	Acondiciono equipo para izar subestructura en FP1131 Equipo Desmontado 80%(Incluido campamento), Transportado 55%, Montado 50%.
Resúmen:	Acondicióno y lavo cargas en CLN.x2006, Continuo transporte y montaje en FP1131: Equipo Desmontado 80%(Incluido campamento), Transportado 55%, Montado 50%.
Próx. 24 hs:	Continuar acondicionando montaje en FP1131. Acondicionar equipo e izar subestructura, Acondicionar y posicionar primer tramo de torre. Transportar Campamento, 2do tramo de torre, Depósitos, tanque de gas oil y misceláneos
Programa:	DTM 147 KM de distancia

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	DTM*	Acondiciona cargas a transportar, acondiciona deposito, lava patines de subestructura Se continuo lavando equipos para transporte. Equipo Desmontado 65 %, Transportado 30 %, Montado 15%	
08:00	20:00	12,00	DTM-DTI	DTM*	Transporto primer tramo de torre, subestructura, misceláneos, MSC, mud boat, rampas, pileta de agua, Dog house En FP 1131 monto circuito sin terminar, cuadro de maniobras, mud boat, Generación, VFD. Posiciono zarandas, acondiciono para montar subestructura. *Cia Marbar desmonto equipamiento en un 100%, transporte 90%, monto 0%.	
20:00	06:00	10,00	DTM-DTI	DTM*	Acondiciono equipo para izar subestructura en FP1131 Equipo Desmontado 80%(Incluido campamento), Transportado 55%, Montado 50%.	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csq Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey Sin Registro						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

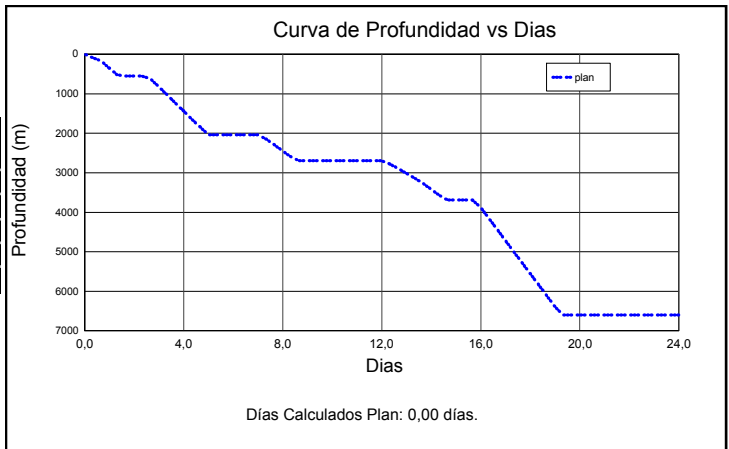

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	15,130	146,949	10,30
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
EFLUENTES	2,927	11,709	57,204	20,47
DIRECCIONAL	0	0	1,011,232	0,00
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	6,000	155,936	289,422	53,88
CTRL SOLIDOS	78	311	284,857	0,11
EQUIPO	3,341	24,852	1,091,599	2,28
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
TRATAMIENTOS	2,218	8,871	134,274	6,61
EFLUENTES				
<b>TOTAL</b>	<b>18,346</b>	<b>221,971</b>	<b>8,137,334</b>	<b>2,73</b>

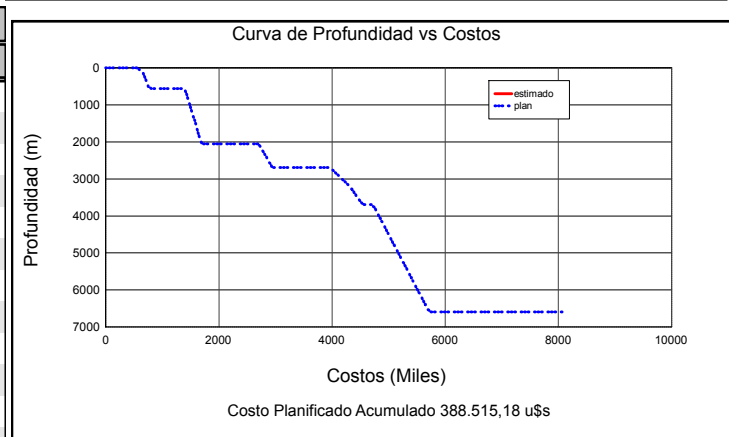

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
