

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Brito Dante - Lopez Mateo	Fecha Inicio: 15/08/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02006-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 1,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: 21,64	Costo Acumulado: 6,452,971 USD
Costo Diario: 58,399 USD		
Horas de Rotación: 0,00 hs	Dias Plan: 32,00	Costo Plan: 6,716,583 USD
TMD: 4.674,00 m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido: 67,63	Gastos: 96,08 %
TVD: 3.004,68 m		

Oper. Act:	Finalizo Desarme total de tiros del peine y evacuación de lodo de piletas auxiliares de Marbar.				
Resúmen:	Acondiciono y movió bandeja hidráulica. Desarmo 22 tiros de HWDP y 143 tiros de DP 4". Personal de HP suspende tarea de desarmado de DP hasta llegar reemplazo de operario. Continuo Desarmando total a playa. Fin Evento.				
Próx. 24 hs:	DTM a FP 1131h 147 km de distancia				
Programa:	DTM a FP 1131h 147 km de distancia				

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	07:15	1,25	DTM-PR	DARMA*	Personal de HP suspende tarea de desarmado de tiros de DP hasta llegar reemplazo de operario desafectado de actividad por golpe en dedo de mano izquierda con cuña manual.	
07:15	15:00	7,75	DTM-PR	DARMA*	Desarma sondeo a playa desde el peine, 143 tiros DP 4" de 143 tiros. En simultaneo evacua 350 m3 totales de lodo base oil a planta pulmón en FP 1131. En simultaneo evacuo circuito, Limpio piletas s/(falta fondo de pildora) Cia de MPD WTF desmonto perifericos sin terminar y campamento sin terminar(80%) Cia Marbar retiro segundo silo y transporte a FP 1131, acondiciono piletas y Stand de CDS para DTM sin terminar. Cia GH limpio pileta preparadora sin terminar 80%. Sector de inyeccion trasnporto 90% de los materiales al siguiente PAD ----- Fin evento CLN.x2006. Continua en FP 1131 DTM -----	


(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo				Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)	Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	12,25	9,63	750,34	GUIA	12,25	9,63	1.170,00
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.902,70	1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.620,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.652,37	PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00


Survey						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)
4.674,00	3.004,68	88,01	354,08	1.743,06	214,47	1.394,19
						Dleg.(°/30m)
						0,000

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba		
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:		
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:		
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:		
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:		
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:		
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:		

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	381,30
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	162,00
		Tot. Cum.(m3)	543,30

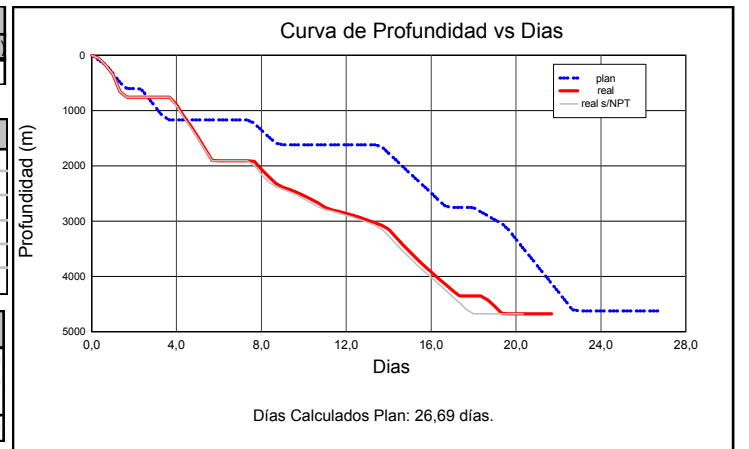

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	7,490	100,126	82,296	121,67
CABZ COLGADORA	0	167,495	162,250	103,23
TRATAMIENTOS EFLUENTES	936	30,852	110,300	27,97
CASING	0	1,564,982	1,620,394	96,58
DIRECCIONAL	0	500,957	630,690	79,43
OTROS	15,200	461,831	271,824	169,90
CTRL SOLIDOS	0	270,846	208,812	129,71
EQUIPO	16,850	1,204,219	1,239,439	97,16
MPD	0	420,331	335,308	125,36
CTRL GEOLOGICO	0	88,434	63,848	138,51
CEMENTACION	0	224,641	349,197	64,33
LODO	2,719	554,549	837,455	66,22
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	12,005	396,187	160,341	247,09
TREPANOS	0	77,494	113,800	68,10
PERFILAJE	0	57,000	25,000	228,00
ENTUBAMIENTO	0	78,560	73,400	107,03
DTM	0	177,665	349,599	50,82
EFLUENTES	3,200	76,800	82,632	92,94
TOTAL	58,399	6,452,971	6,716,583	96,08

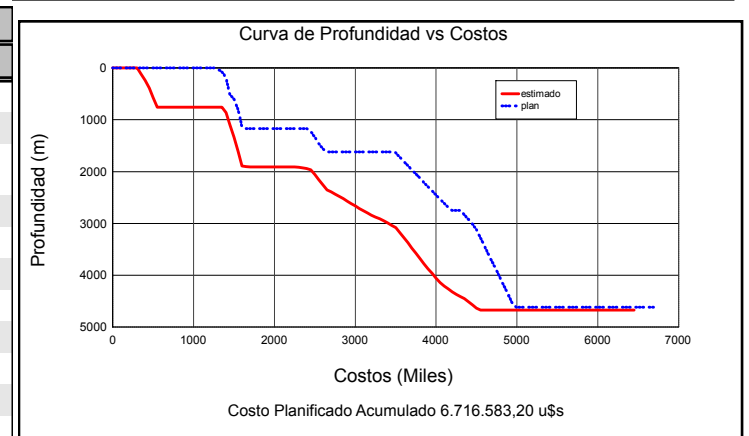

Inspección / Perforación			
Última Prueba BOP:	03/10/2023	Prox. Prueba BOP:	24/10/2023
Seguridad			
Tarjetas de Parada:	0		
