

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: ●	Costo Acumulado: 240,317 USD
Costo Diario: 18,346 USD		
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD
TMD: m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 2,95 %
TVD: m		

Oper. Act:	D 100 %, T 80 %, M 72%.
Resúmen:	Montó VFD, MCC, boomer. Montó campamento de manera parcial. Levantó subestructura, dog house. Contro de sólidos montó circuito y equipamiento parcial. Continuó con transporte de cargas desde CLN.x-2005 a FP-1131.
Próx. 24 hs:	Continuar vistiendo y acondicionando torre. Purgar cilindros. Levantar la misma. Continuar con montaje de equipo, campamento. Continuar trasportando cargas desde CLN.x-2005.
Programa:	DTM 147 KM de distancia.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	06:00	24,00	DTM-DTI	DTM*	* Montó VFD, MCC, boomer, pileta de agua. Montó campamento parcial. * Montó y levantó sub estructura. Vinculó primer y segundo tramo de torre. Vistió torre de manera parcial. Levantó piso de enganche. * Personal de Worklift inspeccionó líneas y eslingas de equipo. * Control de sólidos montó circuito y equipamiento parcial. * Montó y levantó dog house. * En CLN.x-2005 continuó desmontando equipo y transportando cargas. * D 100%, T 80%, M 72%.	

(*) Fase/Código excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey-Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00		
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

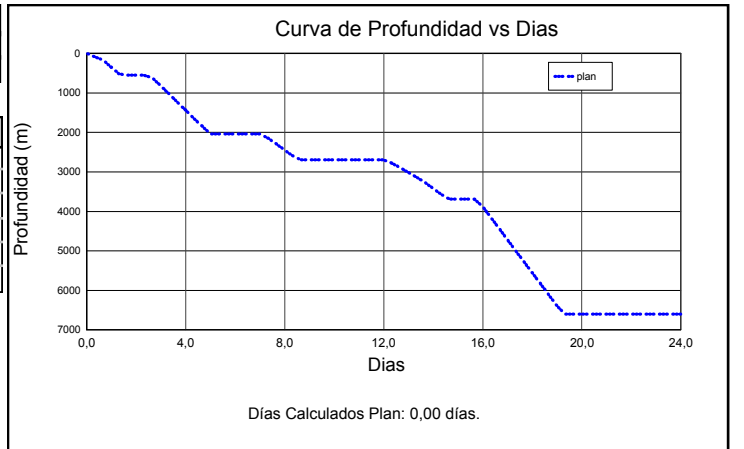

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	18,913	146,949	12,87
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS	2,218	11,089	134,274	8,26
EFLUENTES				
DIRECCIONAL	0	0	1,011,232	0,00
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	6,000	161,936	289,422	55,95
CTRL SOLIDOS	78	389	284,857	0,14
EQUIPO	3,341	28,193	1,091,599	2,58
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
EFLUENTES	2,927	14,636	57,204	25,59
TOTAL	18,346	240,317	8,137,334	2,95

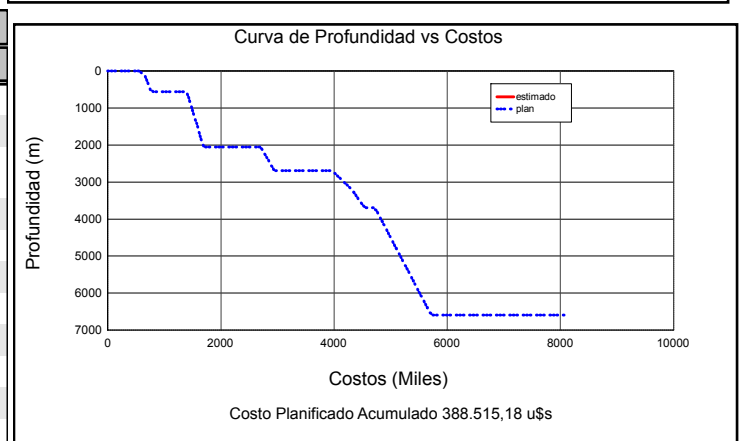

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
