



Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h)
Reporte No.: 1
Fecha Reporte: 15/07/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso: 0,00 m	DFS: ●	Costo Acumulado: 7,311 USD	Costo Diario: 7,311 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 41,90	Costo Plan: 9,480,486 USD	TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 0,08 %	TVD: m

Oper. Act: DTM desde CLN.x-2001 a CLN.x-2005. D 5%, T 0%, M 0%.

Resúmen: Aconicionó piso de trabajo. Pinó TDs.

Próx. 24 hs: Continuar desvinculando circuito. Continuar acondicionando para bajar Torre. Acondicionar periféricos.

Programa: DTM

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
02:30	06:00	3,50	DTM-DTI	ATORRE*	Acondiciona piso de trabajo. Retira vaina, plano inclinado. Pina Top drive. Continúa evacuando circuito de Marbar. Restantes 180 m³	

(*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00


Survey Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol. Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

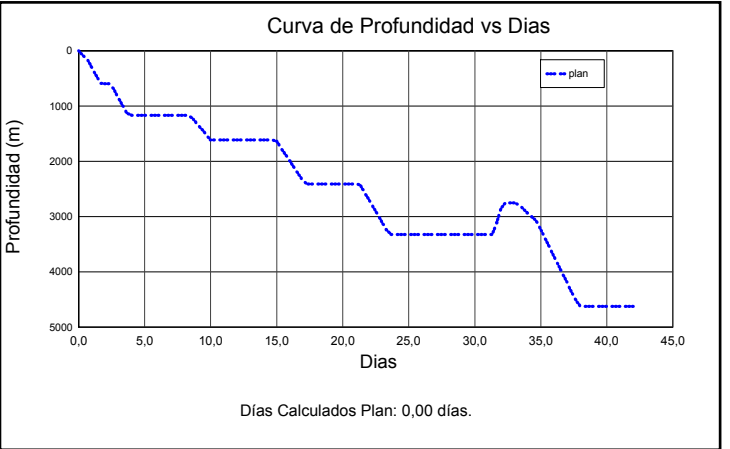

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	0	0	111,187	0,00
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	0	0	148,286	0,00
DIRECCIONAL	0	0	742,284	0,00
CASING	0	0	2,244,307	0,00
OTROS	0	0	322,270	0,00
CTRL SOLIDOS	0	0	206,989	0,00
EQUIPO	7,311	7,311	1,920,802	0,38
MPD	0	0	524,295	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	177,637	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
TREPANOS	0	0	139,450	0,00
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
LODO	0	0	1,104,763	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	349,599	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	131,756	0,00
EFLUENTES	0	0	103,776	0,00
TOTAL	7,311	7,311	9,480,486	0,08

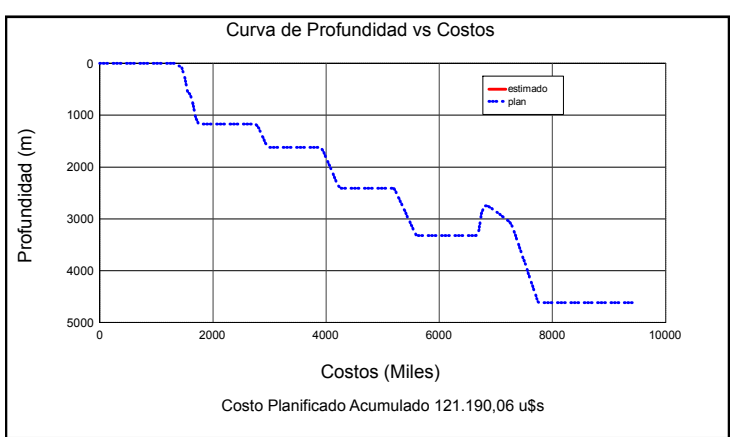

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
