



Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2006(h)
Reporte No.: 13
Fecha Reporte: 03/10/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/08/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02006-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCIONAL	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 1,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: 6,88	Costo Acumulado: 2,168,362 USD
Costo Diario: 112,270 USD		
Horas de Rotación: 0,00 hs	Dias Plan: 32,00	Costo Plan: 6,716,583 USD
TMD: 1.908,00 m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido: 21,50	Gastos: 32,28 %
TVD: 1.880,50 m		

Oper. Act:	Corre y corta cable de perforación.
Resúmen:	Desmontó BOP. Realizó skidding de CLN.x-2005 a CLN.x-2006. Montó y torquéó stack de BOP. Desmontó CDS. Cambió saver sub. Realizó prueba de BOP. Realizó prueba de RCD y línea primaria de MPD. En simultáneo en CLN.x-2005 cementó off-line.
Próx. 24 hs:	Armar BHA direccional. Bajar herramienta hasta contactar collar. Probar casing. Rotar medio shoe track. Probar casing nuevamente. Continuar rotando y perforar 3 m de formación. Realizar FIT. Realizar fingerprinting. Perforar etapa producción.
Programa:	Armar BHA direccional. Perforar etapa producción hasta +/- 4615 m.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	SK P-12	DBOP*	Destorquee BOP stack 135/8" 10k. Desmonta BOP con boomer.	
08:00	08:15	0,25	SK P-12	RNON*	* Acondiciona para realizar Skidding.	
08:15	13:00	4,75	SK P-12	SKIDDING	Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno.	
					Realiza skidding del pozo CLN.x-2005h hasta el pozo CLN.x-2006h.	
					* Vacía bodega con Vactor y monta spool adapter 11" 10k x 13 5/8" 10k.	
					* En simultáneo se prueba manifold off-line.	
13:00	14:00	1,00	SK P-12	MBOP*	Baja BOP stack 13 5/8" 10k con boomer. Acondiciona.	
14:00	15:30	1,50	SK P-12	ACOND*	Compañía Nabors desmonta CDS.	
					* En simultáneo continua torqueando uniones esparraigadas.	
					* En simultáneo en CLN.x-2005 compañía MMA monta DSA 13 5/8" 10M- 5 1/8" 15 M, válvula maestra, DSA 5 1/8" 15 M-7 1/16 10M. Prueba equipamiento.	
15:30	17:30	2,00	SK P-12	MBOP*	Termina torquee de DSA 11" 10M x 13 5/8" 10M.	
17:30	18:30	1,00	SK P-12	MMPD*	Compañía WFT MPD monta línea primaria..	
18:30	20:00	1,50	SK P-12	ACOND*	Personal de mantenimiento termina de colocar guías de TDS.	
					* En simultáneo en CLN.x-2005 compañía HALL monta cabeza y líneas de cementación off-line.	
20:00	20:15	0,25	SK P-12	RNON*	Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno.	
20:15	22:00	1,75	SK P-12	ACOND*	Reemplaza Saver sub en TDS (6 5/8" reg - NC-50) x (6 5/8" reg - XT-39).	
22:00	23:00	1,00	SK P-12	MBOP*	Instala tapón de prueba, XO NC-50-XT39, DP 4", side entry sub, válvula de pasaje pleno.	
23:00	02:45	3,75	SK P-12	MBOP*	Realiza prueba de stack de BOP:	
					Anular 350 y 3500 psi.	
					Parcial superior, parcial inferior, exterior e interior de kill line, manual de choke line y HCR, shear blind ram con P 35 y 8800 psi.	
					* En simultáneo en CLN.x-2005 realiza cementación off line.	
					Realiza prueba de líneas con P 500 y 8500 psi.	
					Circula pozo con Q 4 bpm, P 2100 psi.	
					Bombea 45 bbl de lodo 2.4 gr/cc, 80 bbl turned prime. Lanza tapón inferior. Bombea 68 bbl de lechada principal.	
					Lanza tapón superior. Desplaza con 254 bbl realizando tope tapón. Desfoga, retornando 5 bbl, observando funcionamiento de elementos de flotación.	
02:45	04:15	1,50	SK P-12	MMPD*	Compañía WFT MPD instala tapón en RCD. Realiza prueba de RCD con 350 y 4000 psi, ok. Retira tapón de prueba e instala campana de viaje.	
04:15	06:00	1,75	SK P-12	ACOND*	Corre y corta cable de perforación, en curso.	
					* En simultáneo en CLN.x-2005 alinea para realizar bull heading. Realiza prueba de inyectividad, aumentando caudal progresivamente hasta 3 bbl con P 5200 psi, con tendencia a seguir aumentando (bombeado durante prueba 51 bbl)	

(*)Fase/Código excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)
GUIA	12,25	9,63	750,34
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.902,70

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	12,25	9,63	1.170,00
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.620,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00


Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.(°/30m)
1.887,97	1.860,48	1,44	101,42	-4,52	217,27	170,08	1,165

LODO - EMULSION INVERSA			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m): 1.908,00	FilterCake(32nd"): 7,00	GELS (0s/10s/ 10m/30	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc): 1,450	HTHP(cc/30min): 80,00	/ 7 / 10	TMD:	
YP (lbf/100 ft2): 7,00	Oil (%): 8,00	/ 15	TVD:	
FV (s/qt): 59,00	pH: 8,00		Densidad:	
PV (cp): 13,00	MBT (lbm/bbl): 64,00		Pres. en Sup:	
Temp C:			EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	164,70
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	49,30
		Tot. Cum.(m3)	214,00

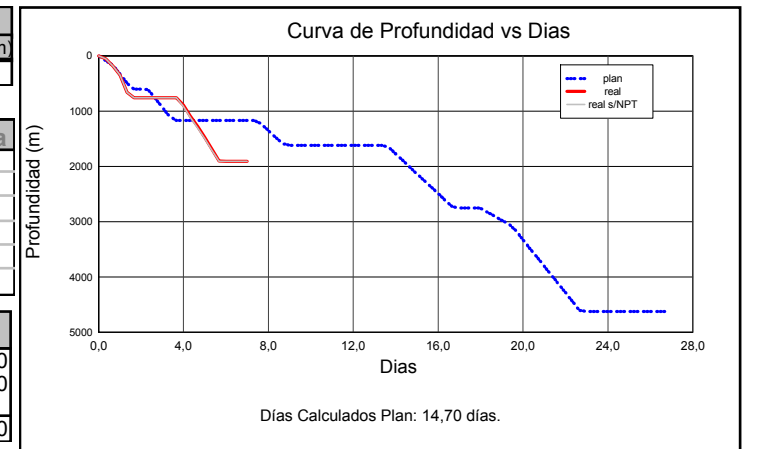

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	1,913	36,572	82,296	44,44
CABZ COLGADORA	0	162,911	162,250	100,41
TRATAMIENTOS EFLUENTES	855	12,992	110,300	11,78
DIRECCIONAL	3,350	99,804	630,690	15,82
CASING	0	548,205	1,620,394	33,83
CTRL SOLIDOS	6,436	60,259	208,812	28,86
OTROS	13,760	121,597	271,824	44,73
MPD	15,983	17,282	335,308	5,15
EQUIPO	42,224	434,536	1,239,439	35,06
CTRL GEOLOGICO	3,234	35,575	63,848	55,72
CEMENTACION	0	95,056	349,197	27,22
LODO	2,129	173,262	837,455	20,69
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	19,186	27,613	160,341	17,22
TREPANOS	0	64,898	113,800	57,03
PERFILAJE	0	57,000	25,000	228,00
DTM	0	177,665	349,599	50,82
ENTUBAMIENTO	0	27,136	73,400	36,97
EFLUENTES	3,200	16,000	82,632	19,36
TOTAL	112,270	2,168,362	6,716,583	32,28

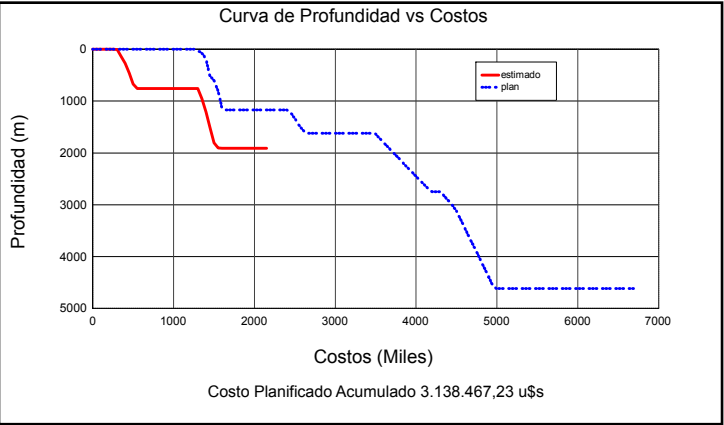

Inspección / Perforación			
Última Prueba BOP:	20/09/2023	Prox. Prueba BOP:	11/10/2023
Seguridad			
Tarjetas de Parada:	1		
