



Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h)
Reporte No.: 7
Fecha Reporte: 28/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: ●	Costo Acumulado: 258,663 USD Costo Diario: 18,346 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 3,18 % TVD: m

Oper. Act: Equipo Desmontado 100%, Transportado 90%, Montado 82%.

Resúmen: Monto PDS, acumulador. Pino banderas, vínculo bloque con top drive. Purgo cilindros. Acondiciono y levanto mástil. Continúo con montaje de campamento. Trasporto flow line y misceláneos. Energizo equipo. Monto Flow line, levanto zarandas y acondiciono cir

Próx. 24 hs: Continuar Montaje de equipo, acondicionar circuito, preparar lodo base agua, vestir subestructura. acondicionar cuadro de maniobra

Programa: DTM, preparar lodo base agua, realizar check list de equipo, Perforar guía de 17 1/2" con BHA direccional de WTF

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	06:00	24,00	DTM-DTI	DTM*	<p>* Monta bandeja hidráulica, acumulador.</p> <p>* Pina banderas, vincula bloque con top drive. Purga cilindros. Acondiciona mástil. Levanta el mismo.</p> <p>* Control de sólidos continúa con montaje de equipamiento y piletas. Inyección acopia materiales.</p> <p>* Continúa con montaje de campamento.</p> <p>* Trasporta flow line, misceláneos desde CLN.x-2005.</p> <p>* Energiza equipo</p> <p>* Monta Flow line, levanta zarandas y acondiciona circuito sin terminar</p> <p>* En CLN.x-2005: Grupo Horizonte limpió bodegas. MMA montó conjunto de cierre de CLN.x-2005 y 2006. Vistió cabezal y probó únicamente CLN.x-2006(Suspendió maniobra por fuertes rafagas de viento)</p> <p>* D 100%, T 90%, M 82%.</p>	

(*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey Sin Registro						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)

LODO -			FIT/LOT Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"): 0,00	GELS (0s/10s/10m/30	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min): 0,00		TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%): 0,00		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%): 0,00		Densidad:	
PV (cp):	pH: 0,00		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl): 0,00		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

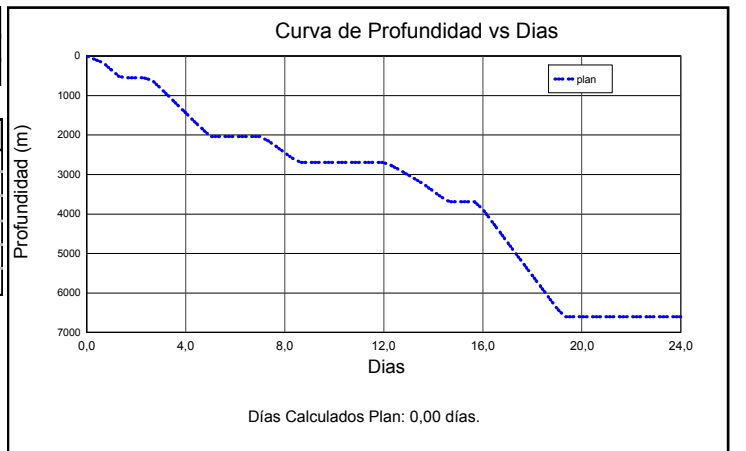

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	22,695	146,949	15,44
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	2,218	13,307	134,274	9,91
DIRECCIONAL	0	0	1,011,232	0,00
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	6,000	167,936	289,422	58,02
CTRL SOLIDOS	78	467	284,857	0,16
EQUIPO	3,341	31,533	1,091,599	2,89
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
EFLUENTES	2,927	17,563	57,204	30,70
TOTAL	18,346	258,663	8,137,334	3,18

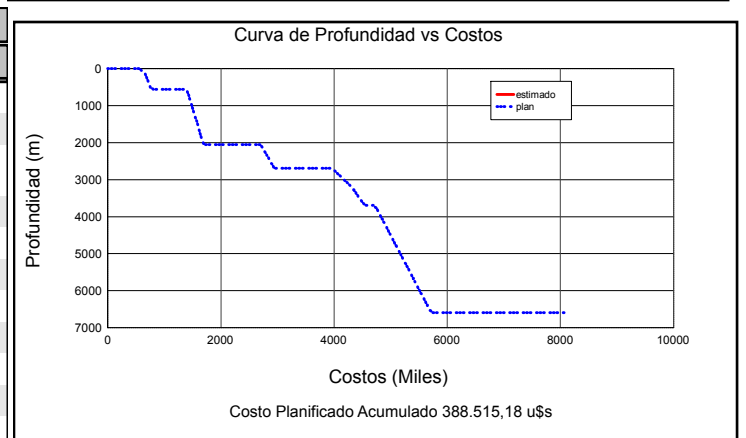

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
