



Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h)
Reporte No.: 4
Fecha Reporte: 18/07/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: ●	Costo Acumulado: 45,166 USD Costo Diario: 15,055 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 41,90	Costo Plan: 9,480,486 USD TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 0,48 % TVD: m

Oper. Act:	DTM desde CLN.x-2001 a CLN.x-2005. D 85%, T 60%, M 45%.
Resúmen:	Trasportó subestructura, zarandas, patines, bomba 3, separador, centro de mesa, drawworks, HPU, tramo inferior del mástil. Montó pileta rectangular, 3 bombas de lodo, patín de zarandas, mud boat, subestructura, HPU, tramo inferior del mástil, pileta, BOP.
Próx. 24 hs:	Transportar y montar campamento. Energizar equipo. Continuar vinculando circuito. Continuar DTM.
Programa:	DTM de CLN.x-2001/2002 a CLN.x-2005/2006

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	LIMP*	Acondiciona cargas para transporte.	
08:00	08:15	0,25	DTM-DTI	RNON*	Realiza reunión de seguridad y operativa.	
08:15	20:00	11,75	DTM-DTI	TTORRE*	. Desmontó y transportó subestructura, zarandas, patines, misceláneos, pileta de agua, generadores, . Transportó bomba 3, separador con manifold, centro de mesa, drawworks, HPU, tramo inferior de mástil. . Montó pileta rectangular, 3 bombas de lodo, patín de zarandas, mud boat, drawworks, subestructura, HPU, tramo inferior del mástil, generadores parcialmente. . Control de sólidos transportó unidad, 1 pileta auxiliar. . Grupo horizonte terminó con limpieza de piletas de Marbar. . Realiza reunión de seguridad y operativa.	
20:00	20:15	0,25	DTM-DTI	RNON*		
20:15	06:00	9,75	DTM-DTI	TSUBESTI	. Coloca centro de mesa, posiciona pileta de agua, BOP. . Monta HPU. Purg cilindros y levanta subestructura. . D 85%, T 60%, M 45%	

(*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00


Survey Sin Registro						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

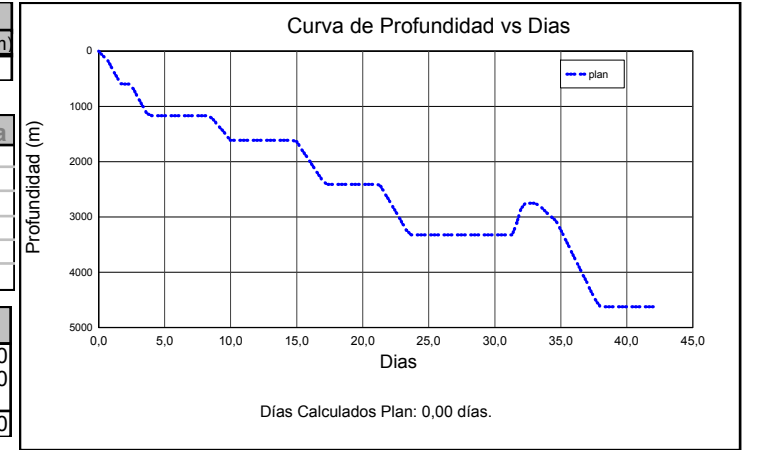

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,012	12,037	111,187	10,83
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	748	2,245	148,286	1,51
DIRECCIONAL	0	0	742,284	0,00
CASING	0	0	2,244,307	0,00
OTROS	5,500	16,500	322,270	5,12
CTRL SOLIDOS	0	0	206,989	0,00
EQUIPO	1,495	4,485	1,920,802	0,23
MPD	0	0	524,295	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	177,637	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	2,100	6,300	1,104,763	0,57
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	131,756	0,00
TREPANOS	0	0	139,450	0,00
DTM	0	0	349,599	0,00
EFLUENTES	1,200	3,600	103,776	3,47
TOTAL	15,055	45,166	9,480,486	0,48

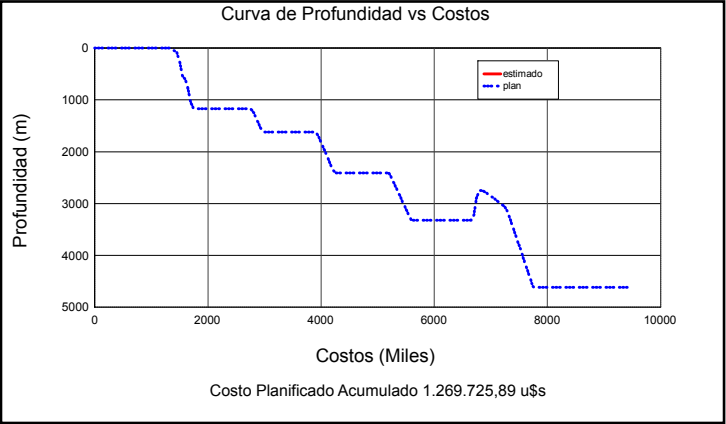

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
