



Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1261(h)
Reporte No.: 1
Fecha Reporte: 01/11/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: L. Barvo /J. Copa /M. Sosa	Fecha Inicio: 01/11/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01261-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@581,00 m	Costo AFE: 8.196.606,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: ●	Costo Acumulado: 29,701 USD Costo Diario: 29,701 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 26,10	Costo Plan: 8,196,606 USD TMD: 0,00 m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 0,36 % TVD: 0,00 m

Oper. Act: Acondiciona mástil para bajar el mismo.

Resúmen: Desvistió mástil, pinó patines, banderas, purgó cilindros. Desvinculó parte de circuito. Transportó miscelaneos a nueva locación (3%). Limpia y desvincula resto de circuito. WTFD trasportó 100%. Marbar CDS desmontó 70%, Transp: 40%.

Próx. 24 hs: DTM a nueva locación PAD FP-1261/64, sobre 23km.

Programa: DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
11:00	18:00	7,00	DTM-DTI	DCIRC*	Desmonta 3 en 1. Baja flow line. Acondiciona piso de trabajo y torre, asegura banderas, acondiciona guinches. Baja golpeador y plano inclinado. Pina TD. Transportó circuito parcial. Sin montar en nueva locación. Cia Marbar CDS, desmontó parcial (90%) - transportó: (60%). Marbar lodos: acopia productos base agua. Cia WTFD MPD, desmontó y transporte a base Añelo 100%. Falta retirar trailers vivienda. Purga cilindros. Alínea buggy. Desviste mástil.	
18:00	20:00	2,00	DTM-DTI	ATORRE*	Realiza charla de seguridad y operativa con turno entrante.	
20:00	20:30	0,50	DTM-DTI	RNON*	Continúa acondicionando para bajar mastil. Baja dog house. Lava y desvincula parte del circuito faltante. Lava y limpia canaletas de zarandas. Retira lengüeta de zaranda, escalera, casilla enganchador. Mangueras entre piletas. Retira con palas solidos de canaletas en zona zaranda.	
20:30	06:00	9,50	DTM-DTI	ASUB*		

(*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.700,00


Survey Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00				
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00

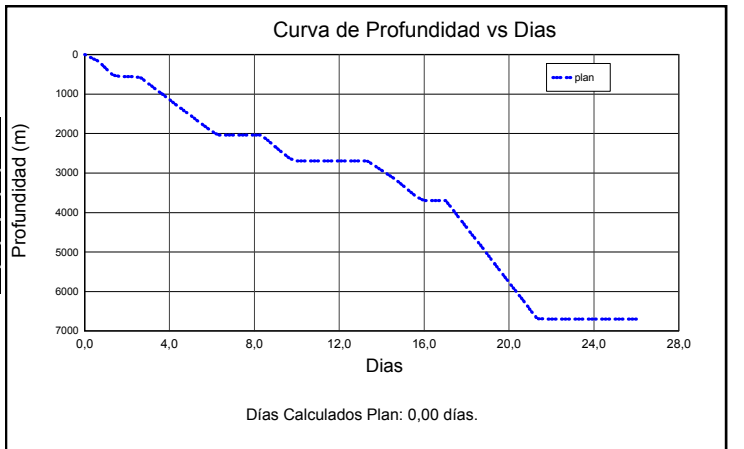

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,237	4,237	148,916	2,85
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
EFLUENTES	3,200	3,200	57,204	5,59
DIRECCIONAL	0	0	1,031,644	0,00
CASING	0	0	2,695,524	0,00
OTROS	6,707	6,707	292,379	2,29
CTRL SOLIDOS	9,680	9,680	292,039	3,31
EQUIPO	1,447	1,447	1,174,184	0,12
MPD	0	0	477,141	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	57,723	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
LODO	3,617	3,617	971,318	0,37
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	81,346	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
TRATAMIENTOS	812	812	112,550	0,72
EFLUENTES				
TOTAL	29,701	29,701	8,196,606	0,36

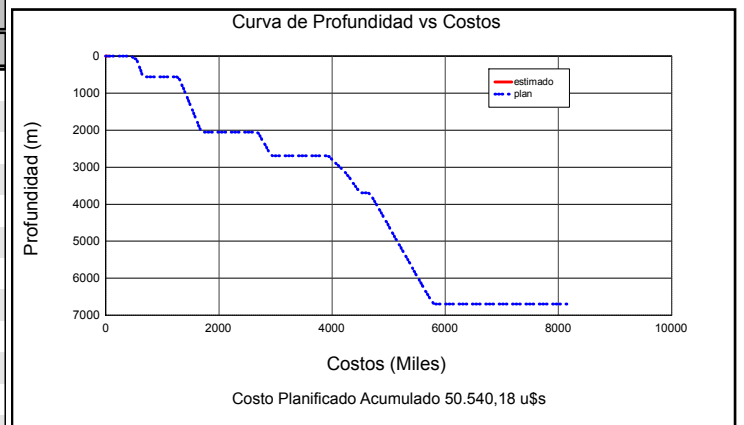

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
