



# Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1261(h)  
Reporte No.: 3  
Fecha Reporte: 03/11/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Lucas Bravo / Jose Copa	Fecha Inicio: 01/11/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01261-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@581,00 m	Costo AFE: 8.196.606,00 USD

Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: <span style="color: green;">●</span> 89,103 USD	Costo Diario: 29,701 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 26,10	Costo Plan: 8,196,606 USD	TMD: 0,00 m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 1,09 %	TVD: 0,00 m

Oper. Act:	Acondiciona montaje de equipo en locación FP-1261.
Resúmen:	Desmonta, transporta y monta Campamento completo. Desmonta centro de mesa. Baja piso de enganche. Particiona mástil para transporte. Bombas de lodo 2 y 3. Generadores 1, 2, 3 y 4. Desmontado 100% Transportado 74%, Montado 45%.
Próx. 24 hs:	DTM a nueva locación PAD FP-1261/64, sobre 23km.
Programa:	DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	DTM*	Acondiciona cargas para transporte. Lava con hidro, en proceso. * Limpia subestructura y Mastil. * Baja patin de zarandas primarias. * Limpia partin de zarandas.	
08:00	08:15	0,25	DTM-DTI	DTM*	Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno.	
08:15	20:00	11,75	DTM-DTI	DTM*	Desmonta: 100% * Campamento completo. * Desmonta centro de mesa. * Baja piso de enganche. * Particiona mástil para transporte. * MCC house. * Drawworks. * Mud boat. * Tracks de flow line.  Transporta: 70% * MCC house. * Drawworks. * Mud boat. * Patin de zarandas. * Patin de Golpeador con manifold. * Mud cleaner 3 en 1. * Tracks de flow line. * Miscellaneos.  Monta: 40% * Bombas de lodo 2 y 3. * Generadores 1, 2, 3 y 4. * Patines de skidd para montar bases de subestructura. * Monta Drawworks. * Monta MCC. * Monta circuito de piletas parcial.	
20:00	20:15	0,25	DTM-DTI	DTM*	Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno.	
20:15	06:00	9,75	DTM-DTI	DTM*	Acondiciona montaje de equipo en locación FP-1261 * Vincula piletas de lodo y bombas de lodo. Termina primer trabajo de modificación en zarandas. Monta patin en línea e circuito. Vincula caños de 3 en 1. Tira cables del articulado del MCC. * Realiza limpieza de mastil, subestructura y centro de mesa en locacion FP-1465.	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csq Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.700,00


Survey Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol. Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

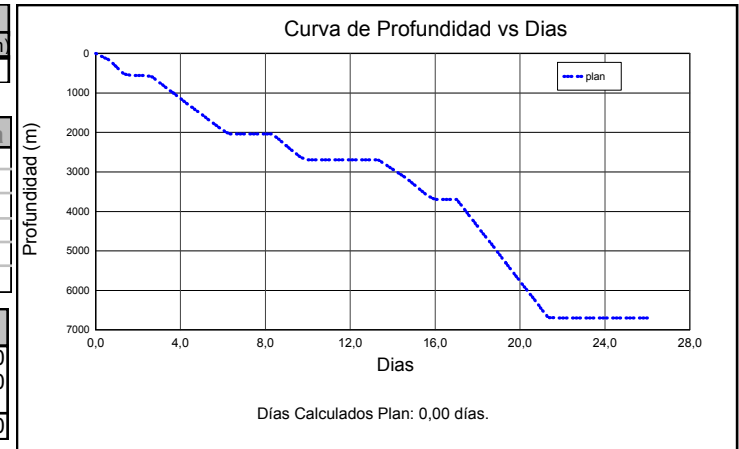

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,237	12,712	148,916	8,54
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	812	2,436	112,550	2,16
DIRECCIONAL	0	0	1,031,644	0,00
CASING	0	0	2,695,524	0,00
OTROS	6,707	20,121	292,379	6,88
CTRL SOLIDOS	9,680	29,040	292,039	9,94
EQUIPO	1,447	4,342	1,174,184	0,37
MPD	0	0	477,141	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	57,723	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
LODO	3,617	10,852	971,318	1,12
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	81,346	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
EFLUENTES	3,200	9,600	57,204	16,78
<b>TOTAL</b>	<b>29,701</b>	<b>89,103</b>	<b>8,196,606</b>	<b>1,09</b>

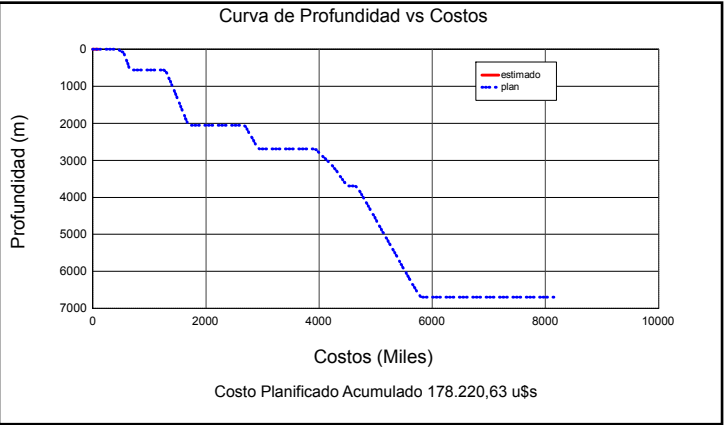

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	1
