



Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1468(h)
Reporte No.: 34
Fecha Reporte: 01/11/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: M Sosa - J. Copa	Fecha Inicio: 19/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01468-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso: 0,00 m	DFS: 23,77	Costo Acumulado: 8,178,312 USD	Costo Diario: 61,749 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,70	Costo Plan: 8,136,149 USD	TMD: 6.520,00 m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido: 100,30	Gastos: 100,52 %	TVD: 3.000,76 m

Oper. Act:	Quebró DP 4" total.
Resúmen:	Terminar desarmar DP a playa, total de 222 tiros. Termino evacuar lodo a locaición nueva. Marbar CDS DTM, s/term. Cia WTFD MPD trasportó 80%.
Próx. 24 hs:	DTM.
Programa:	DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	11:00	5,00	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 222 de 222 tiros. Termina de limpiar circuito de piletas. Eavcúa 100% lodo a planta en nueva locación. NOTA: Cia Marbar CDS transporta miscelaneos, caballetes, piletas a nueva locación. Cia WTFD MPD transporta 100% equipamiento a base Añelo.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)
GUIA	17,50	13,38	556,68
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.997,39
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.739,34
PRODUCCION	6,13	5,00	6.504,05


Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csq Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.(°/30m)
6.520,00	3.000,76	92,45	183,39	-3.469,24	215,08	3.217,90	0,742


LODO - EMULSION INVERSA		
TMD Cheq.(m): 6.520,00	FilterCake(32nd"): 7,00	GELS (0s/10s/10m/30
Densidad(g/cc): 1700,000	HTHP(cc/30min): 89,00	/ 8 / 17
YP (lb/100 ft2): 10,00	Solids (%): 7,00	/ 21
FV (s/qt): 61,00	Oil (%): 58,40	
PV (cp): 24,00	pH: 58,40	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):	

FIT/LOT	
Tipo de Prueba:	FIT
TMD:	2.739,00
TVD:	2.711,29
Densidad:	1,70(g/cc)
Pres. en Sup:	1.275,00
EMW:	2,03(g/cc)

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	644,50
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	196,80
		Tot. Cum.(m3)	841,30

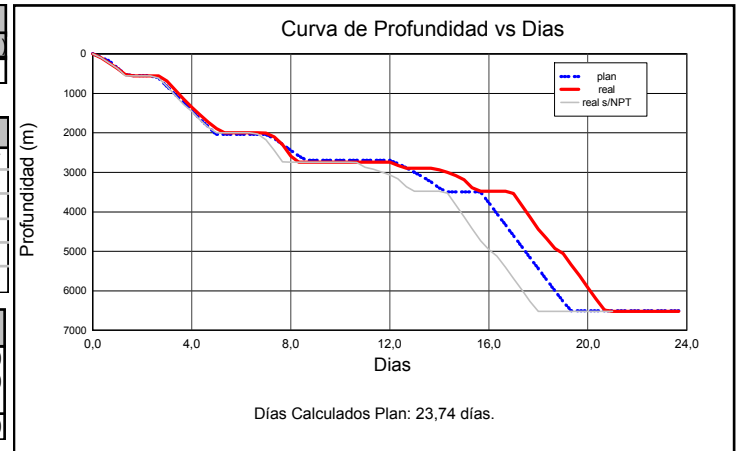

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,237	129,912	146,761	88,52
CABZ COLGADORA	0	198,543	198,500	100,02
TRATAMIENTOS EFLUENTES	812	21,773	134,274	16,22
DIRECCIONAL	0	892,139	990,985	90,03
CASING	0	2,552,373	2,652,079	96,24
CTRL SOLIDOS	9,680	373,329	248,864	150,01
OTROS	6,707	255,739	289,139	88,45
EQUIPO	10,515	1,381,207	1,244,015	111,03
MPD	22,981	586,402	355,626	164,89
CTRL GEOLOGICO	0	57,371	54,338	105,58
CEMENTACION	0	385,772	359,922	107,18
LODO	3,617	875,671	984,834	88,92
TREPANOS	0	98,668	133,550	73,88
ENTUBAMIENTO	0	83,075	82,300	100,94
DTM	0	102,870	92,345	111,40
PERFILAJE	0	24,000	25,000	96,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	53,866	86,412	62,34
EFLUENTES	3,200	105,600	57,204	184,60
TOTAL	61,749	8,178,312	8,136,149	100,52

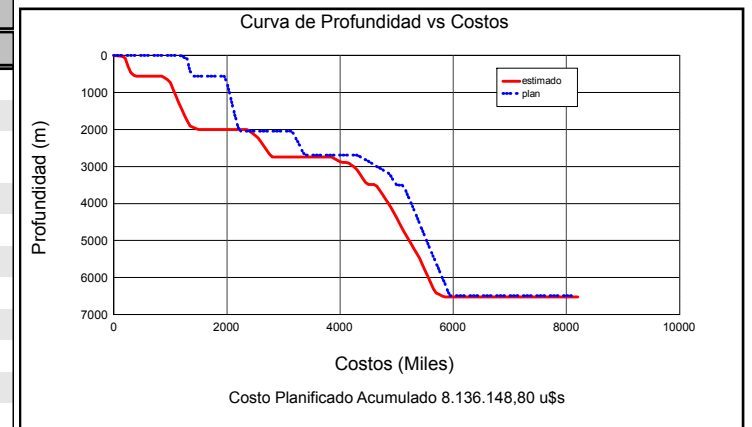

Inspección / Perforación			
Última Prueba BOP:	09/10/2023	Prox. Prueba BOP:	30/10/2023
Seguridad			
Tarjetas de Parada:	0		
