

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Iturbe Jose - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: 20,52	Costo Acumulado: 2,771,324 USD
Costo Diario: 61,741 USD		
Horas de Rotación: 0,00 hs	Dias Plan: 41,90	Costo Plan: 9,480,486 USD
TMD: 1.173,00 m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido: 48,97	Gastos: 29,23 %
TVD: 1.172,96 m		

Oper. Act:	Termina desarmada de peine a playa de DP 4".
Resúmen:	Esperó fragüe de cemento. Equipo parado por fuerza mayor (elecciones). Liberó peso de casing, ok. Desmontó equipamiento de entubación. Desarmó a playa 7 tiros DC 6 1/2", 3 tiros de HWDP 4", 31 tiros DP 4".
Próx. 24 hs:	Terminar de desarmar tiros. Acondicionar y realizar skidding de CLN.x-2005 a CLN.x-2006. Reparar braker de generador #4, blower de TD. Acondicionar y armar al peine 4 tiros de DC 6 1/2", 2 tiros de DC 8".
Programa:	Skidding CLN.x-2005 a CLN.x-2006.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	SK G-G	ACOND*	Espera fragüe de cemento, con casing con tensión (75 klb).	
08:00	14:00	6,00	SK G-G	ACOND*	Equipo parado por fuerza mayor (elecciones).	
14:00	16:00	2,00	SK G-G	ACOND*	Continúa con espera de fragüe de cemento.	
16:00	17:30	1,50	SK G-G	ACOND*	Libera peso de casing, sin observar desplazamiento del mismo. Retira casing de maniobra a playa. Acondiciona bodega.	
17:30	19:30	2,00	SK G-G	ACOND*	Desmonta CDS, spider, service loop.	
19:30	20:00	0,50	SK G-G	ACOND*	Acondiciona TDS, piso de trabajo. Realiza reunión de seguridad y operativa.	
20:00	06:00	10,00	SK G-G	ACOND*	Desarma 7 tiros de DC 6 1/2" de peine a playa, 3 tiros de HWDP 4", 31 DP 4".	

(*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)
GUIA	17,50	13,38	1.167,14

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00


Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.°/30m
1.173,00	1.172,96	0,70	198,45	-6,44	-4,85	-4,11	0,224

LODO - BASE AGUA			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m): 1.173,00	FilterCake(32nd"): 1,210	HTHP(cc/30min): 16,00	GELS (0s/10s/10m/30): / 13 / 30 / 35	Tipo de Prueba:
Densidad(g/cc): 1,210	YP (lb/100 ft2): 64,00	Oil (%): 14,00	pH: 9,00	TMD:
Temp C: 14,00	MBT (lbm/bbl): 20,00			TVD:
				Densidad:
				Pres. en Sup:
				EMW:

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

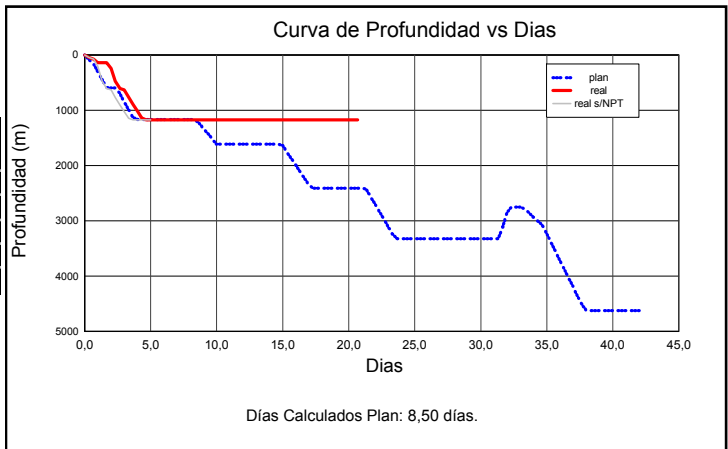

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,359	100,635	111,187	90,51
CABZ COLGADORA	0	6,697	198,850	3,37
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
CASING	0	372,798	2,244,307	16,61
DIRECCIONAL	0	163,172	742,284	21,98
CTRL SOLIDOS	6,065	133,425	206,989	64,46
OTROS	3,950	114,596	322,270	35,56
EQUIPO	40,253	873,837	1,920,802	45,49
CTRL GEOLOGICO	3,234	71,149	177,637	40,05
CEMENTACION	0	101,346	486,936	20,81
MPD	0	0	524,295	0,00
LODO	2,429	229,113	1,104,763	20,74
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
PERFILAJE	0	101,920	485,000	21,01
DTM	0	177,665	349,599	50,82
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	265,056	131,756	201,17
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
TRATAMIENTOS	1,453	31,970	148,286	21,56
EFLUENTES				
TOTAL	61,741	2,771,324	9,480,486	29,23

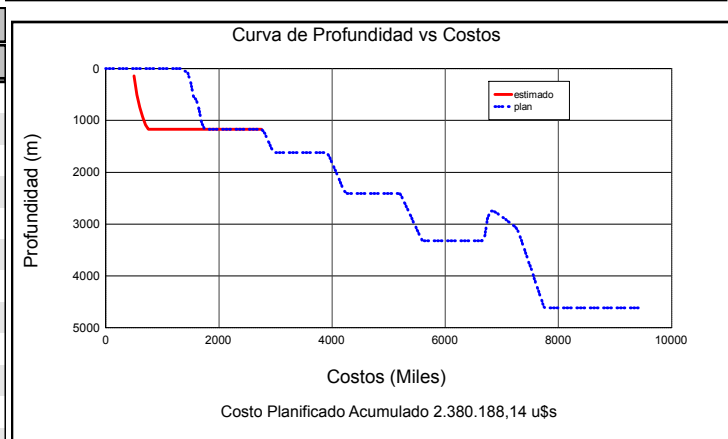

Inspección / Perforación			
Última Prueba BOP:		27/06/2023	Prox. Prueba BOP: 18/07/2023
Seguridad			
Tarjetas de Parada:		0	
