



# Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h)  
Reporte No.: 4  
Fecha Reporte: 25/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA		Supervisor: Brito Dante / Mateo Lopez / Angel Quiroz		Fecha Inicio: 22/10/2023			
Bloque:		Equipo: H&P/211		AFE No.: FPPE-01131-PE			
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,		Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m		Costo AFE: 8.137.334,00 USD			
Progreso:	0,00 m	DFS:		Costo Acumulado:	203,625 USD	Costo Diario:	29,836 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	23,90	Costo Plan:	8,137,334 USD	TMD:	m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:		Gastos:	2,50 %	TVD:	m

Oper. Act: Acondiciona cargas a transportar, acondiciona deposito, lava patines de subestructura Se continuo lavando equipos para transporte..  
Resúmen: Desmontado 65 %, Transportado 30 %, Montado 15%. Por condición climática, reparo acceso al equipo(NPT 7.75 hs en transporte)  
Próx. 24 hs: Acondicionar y Lavar patines de subestructura. Continuar con transporte de patines y subestructura, misceláneos, MSC, torre, pileta de agua.  
Continuar montaje de circuito, generación, mud boat, rampas.  
Programa: DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:30	2,50	DTM-DTI	DSUB*	Retira HPU/acumulador. Lava centro de mesa, acondiciona zarandas, Retiro a estacionamiento Primer tramo del mastil	
08:30	16:15	7,75	DTM-DTI	DTM*	Equipo Desmontado 55 %, Transportado 15 %, Montado 0%. Transporte detenido por reparacion de ingreso a locación por condicion climatica(lluvia) Desmonta equipo: Acondicono y retiro mud boat Retiro y limpieza del cuadro de maniobra limpieza de patines de subestructura, limpieza de zarandas En FP 1131 monto circuito sin terminar	
16:15	20:00	3,75	DTM-DTI	DTM*	Continua transporte de equipo, Generacion, embudos, VFD, zarandas, miscelaneos, cuadro de maniobras Se continuo lavando equipos para transporte.	
20:00	06:00	10,00	DTM-DTI	DTM*	Equipo Desmontado 55 %, Transportado 15 %, Montado 15%. Acondiciona cargas a transportar, acondiciona deposito, lava patines de subestructura Se continuo lavando equipos para transporte. Equipo Desmontado 65 %, Transportado 30 %, Montado 15%	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS (0s/10s/ 10m/30	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):		TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

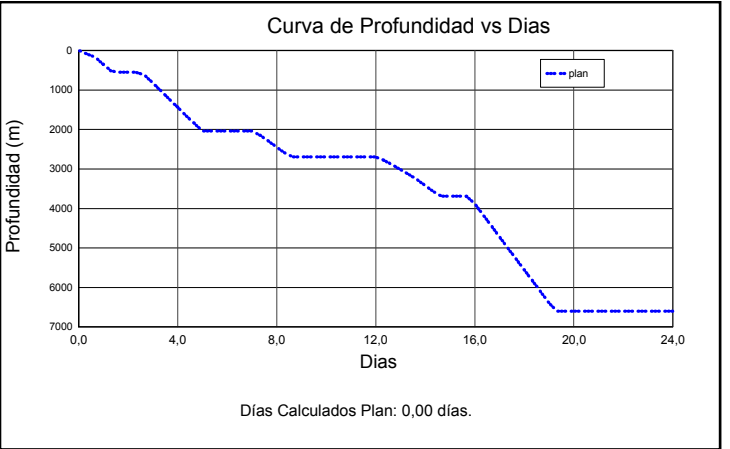

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	11,348	146,949	7,72
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
EFLUENTES	2,927	8,782	57,204	15,35
DIRECCIONAL	0	0	1,011,232	0,00
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	6,000	149,936	289,422	51,81
CTRL SOLIDOS	78	233	284,857	0,08
EQUIPO	14,830	21,511	1,091,599	1,97
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
TRATAMIENTOS	2,218	6,653	134,274	4,96
EFLUENTES				
TOTAL	29,836	203,625	8,137,334	2,50

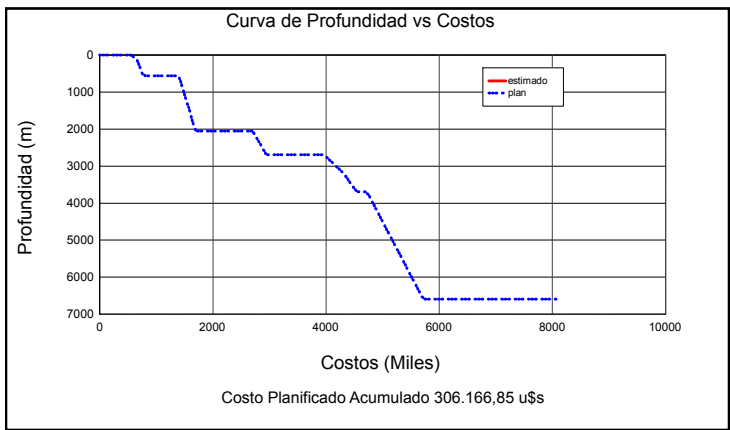

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	4
