



# Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h)  
Reporte No.: 10  
Fecha Reporte: 31/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: 489,153 USD Costo Diario: 171,211 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 6,01 % TVD: m

Oper. Act:	Acondiciona DC 6 1/2" y 8" en caballetes.
Resúmen:	Levantó torre. Desempinó banderas. Enhebró cable de perforación y desempinó bloque. Realizó charla con personal en locación de cultura SAS. Colocó cables en guinches. Acondicionó piso de trabajo. Colocó barandas y lona. Acondiciona DC en caballetes.
Próx. 24 hs:	Armar 6 tiros DC 6 1/2" y 2 tiros de DC 8". Armar BHA direccional y enroscar trépano PDC 17 1/2". Profundizar y perforar etapa guía.
Programa:	Perforar etapa guía hasta +/- 490 m.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	DTM*	Continúa acondicionando periféricos, en espera de luz diurna para levantar torre.	
08:00	08:30	0,50	DTM-DTI	DTM*	Realiza reunión de seguridad y operativa precio a levantar torre.	
08:30	09:15	0,75	DTM-DTI	DTM*	Levanta torre, empina la misma.	
09:15	10:15	1,00	DTM-DTI	DTM*	Desempina pistones para levantar torre.	
10:15	13:00	2,75	DTM-DTI	DTM*	Realiza charla de seguridad con personal en locación, "Cultura SAS".	
13:00	20:00	7,00	DTM-DTI	DTM*	Coloca cables en guinches. Desempina banderas. Acondiciona piso de trabajo. Enhebra cable en cuadro de perforación. Desempina top drive. Continúa acondicionando circuito.	
20:00	03:00	7,00	DTM-DTI	DTM*	Continúa acoindicionando herramientas en piso de trabajo. Instala barandas y lonas. Instala stand pipe, manguerote	
03:00	05:00	2,00	DTM-DTI	DTM*	Repara cables de potencias.	
05:00	06:00	1,00	DTM-PO	BHA*	Realiza check list de aceptación de equipo.	
					Estiba DC 6 1/2" y 8" en caballetes.	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. ColumnaTot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00				
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00

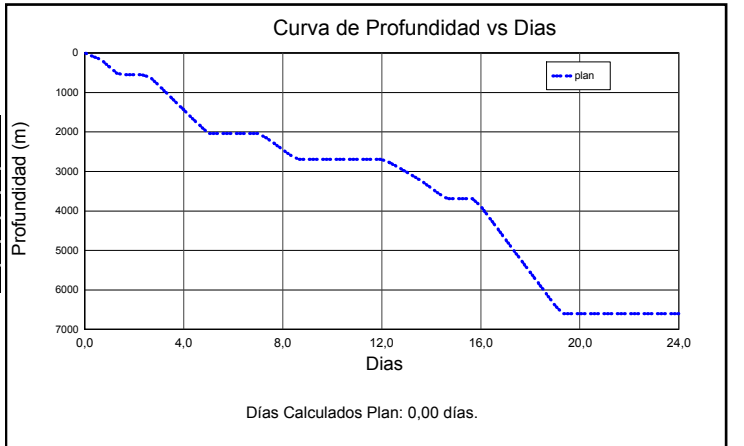

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	34,043	146,949	23,17
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	2,218	19,960	134,274	14,87
DIRECCIONAL	11,294	33,881	1,011,232	3,35
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	6,000	185,936	289,422	64,24
CTRL SOLIDOS	78	700	284,857	0,25
EQUIPO	3,341	41,555	1,091,599	3,81
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
DTM	141,571	141,571	80,646	175,55
LODO	0	0	969,415	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
EFLUENTES	2,927	26,345	57,204	46,05
<b>TOTAL</b>	<b>171,211</b>	<b>489,153</b>	<b>8,137,334</b>	<b>6,01</b>

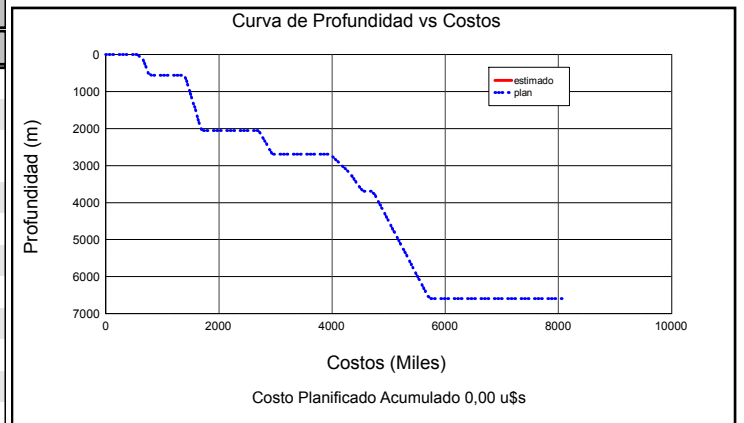

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0
