



# Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h)  
Reporte No.: 3  
Fecha Reporte: 24/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Mateo Lopez	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: 305,725 USD Costo Diario: 152,863 USD
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD TMD: m
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 3,76 % TVD: m

Oper. Act:	DTM desde CLN.x-2005 a FP-1131. D 55%, T 15%, M 0%.		
Resúmen:	Desenergizó y desvinculó circuito. Retiró bandeja hidráulica. Bajó dog house, zarandas, golpeador, 3 en 1, acondiciono y bajo subestructura. Retira cable de perforación. Retiro centro de mesa.		
Próx. 24 hs:	Transportar tramo de mástil. Transportar subestructura, generación, zarandas, patines, misceláneos. Montar circuito, patines. Continuar con DTM.		
Programa:	DTM.		

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	ASUB*	Realiza limpieza con hidrolavadora en mastil. Acondiciona para bajar subestructura. D 25%, T 0%, M 0%	
08:00	06:00	22,00	DTM-DTI	ASUB*	* Desmonto piletta rectangular, cilíndrica, desmonto 3 en1, desgasificador, piletta 1 y 2 de activo. * Bajo separador, rebatió piso de enganche, desvinculo torre en 2 tramos, desmontó bomba 1 - 2 - 3 . * Transporte circuito (a excepción de zaranda, triptank, separador, embudo, flow line). * Transporte BOP a base para mantenimiento. * Acondiciono para bajar subestructura. * Retiro dog house * Bajo subestructura * Bajo zaranda.  Equipo Desmontado 55 %, Transportado 15%, Montado 0%.	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey Sin Registro						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	V/S(m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lbf/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol. Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00

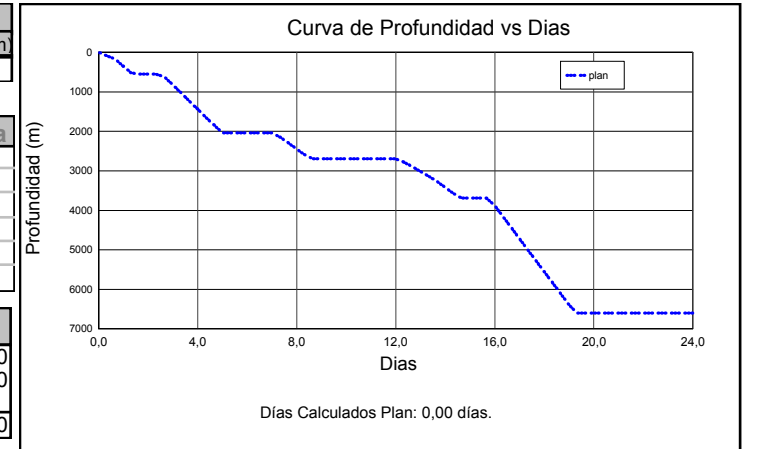

COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	7,565	146,949	5,15
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	2,218	4,436	134,274	3,30
DIRECCIONAL	0	0	1,011,232	0,00
CASING	0	0	2,674,671	0,00
OTROS	137,936	275,871	289,422	95,32
CTRL SOLIDOS	78	156	284,857	0,05
EQUIPO	3,341	6,681	1,091,599	0,61
CTRL GEOLOGICO	2,581	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
EFLUENTES	2,927	5,854	57,204	10,23
TOTAL	152,863	305,725	8,137,334	3,76

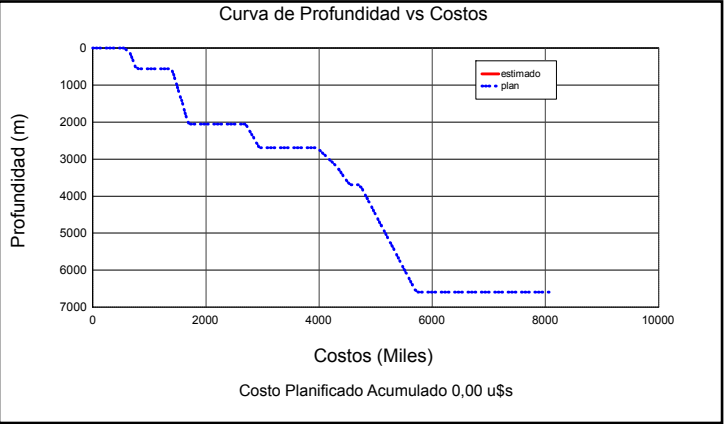

Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	2
